

工事名 : 火打12号スノーシェッド下部その3工事(発注後フィールド事業)
発注者 : 北陸地方整備局 長岡国道事務所
工事概要: ロックアンカー工
 削孔径φ116mm 削孔長17.0m×4本, φ90mm 13.5m×4本
施工時期: 本施工 平成18年7月11日~7月29日




工事名 火打12号 スノーシェッド下部その3工事
 工種 ロックアンカー工
 施工完了後
 全景



工事名 火打12号 スノーシェッド下部その3工事
 工種 ロックアンカー工
 1段目 A
 削孔状況



工事名 : 駒返・風波法面防災外工事(発注後フィールド事業)
発注者 : 北陸地方整備局 高田河川国道事務所
工事概要: ロックアンカー工
 削孔径φ116mm 削孔長9.0m×10本, 8.5m×5本, 8.0m×5本
施工時期: 基本試験工 平成18年7月28日~8月2日
 本施工 平成18年9月8日~9月30日

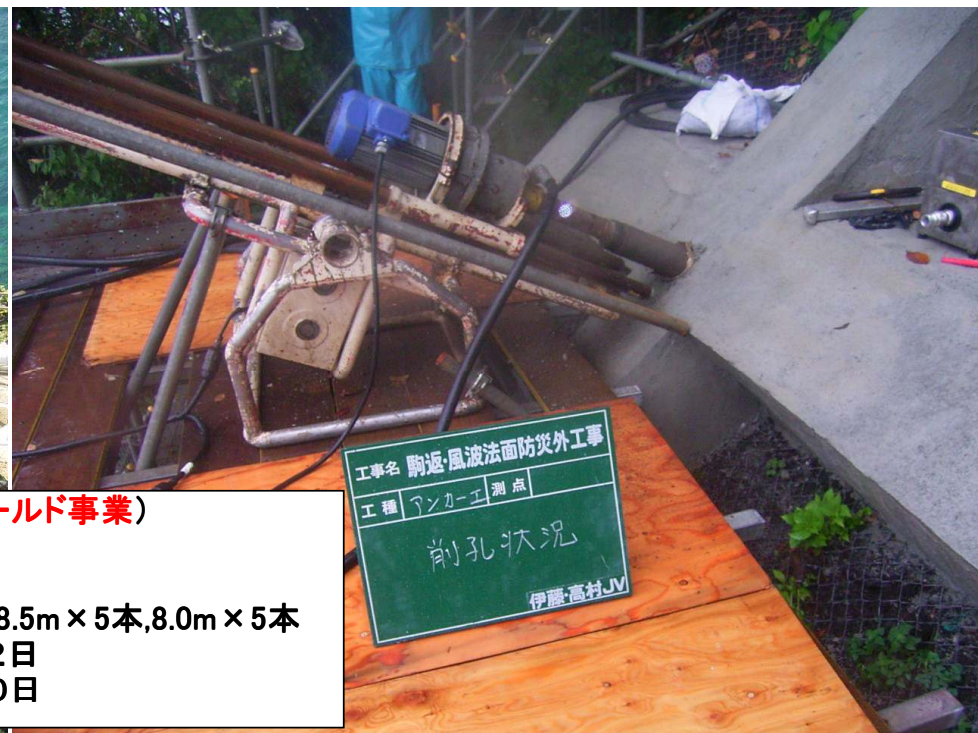

工事名 駒返・風波法面防災外工事
 工種 アンカー工 測点
 削孔状況
 伊藤・高村JV
